


Noviembre 2025

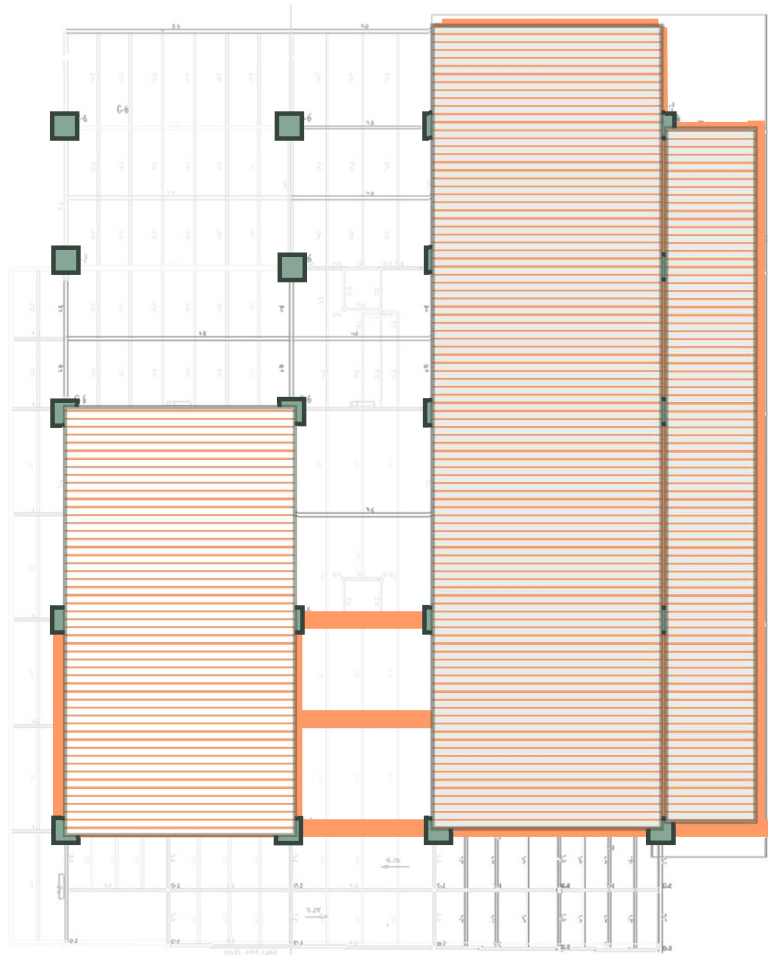


Estructura Metálica
Niveles -1.60 a +15.50

Vigas y Trabes en
sector B-Sur sótanos

Tendido de losacero,

planta

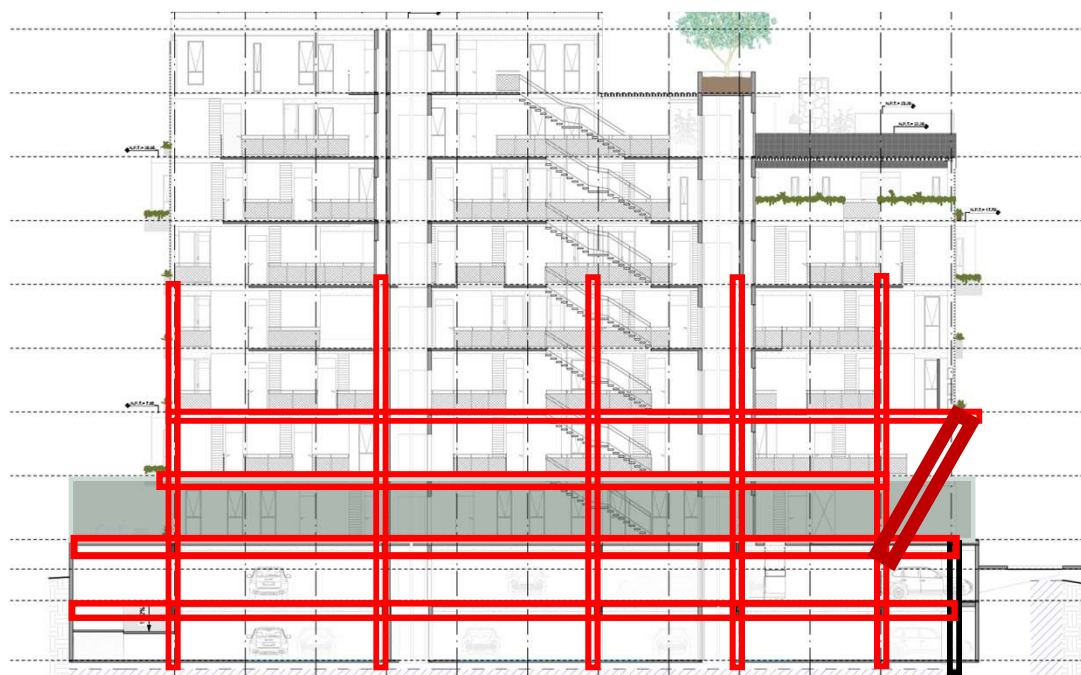

alzado

Noviembre 2025

- Trabes, Vigas y tendido de losacero en Sector B Sur



Noviembre 2025

- Actualización de la carpeta legal (Licencias):
 - Renovación de licencia de construcción
 - Renovación de peritos corresponsables
 - Renovación de póliza de seguro
 - Actualización de constancias

Noviembre 2025

Avance Físico Financiero

PRESUPUESTO															
Preliminares	5%	99.29%	18.50%	22.14%	22.14%	32.22%	0.05%	2.07%	2.07%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
Infraestructura	2%	55.26%	21.29%	20.70%	0.00%	0.00%	0.00%	6.64%	6.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Obra Civil	63%	28.77%	0.00%	0.79%	0.98%	6.64%	4.76%	2.55%	3.81%	4.64%	4.59%	5.39%	6.06%	6.26%	6.64%
Subcontratos	16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.42%	0.00%
Instalaciones	10%	7.88%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.11%	4.77%	1.67%	2.66%	2.48%	1.73%
Equipamiento	3%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.87%	0.00%	0.00%	0.00%
Total Presupuesto	100%	43.09%	1.53%	2.21%	1.82%	5.95%	3.02%	1.90%	2.70%	3.25%	3.37%	3.60%	4.10%	5.27%	4.38%
Acumulado	100%		1.53%	3.74%	5.55%	11.51%	14.53%	16.43%	19.12%	22.37%	25.74%	29.34%	33.44%	38.71%	43.09%

Noviembre 2025

Nuestros Retos para 2026:

- Terminación de Sótanos de Estacionamiento Edificio A
- Continuar con el suministro y colocación de Estructura, Vigas y trabes:
 - Cuadrante B-Sur y B-Norte
- Losacero:
 - Cuadrante B Sur
